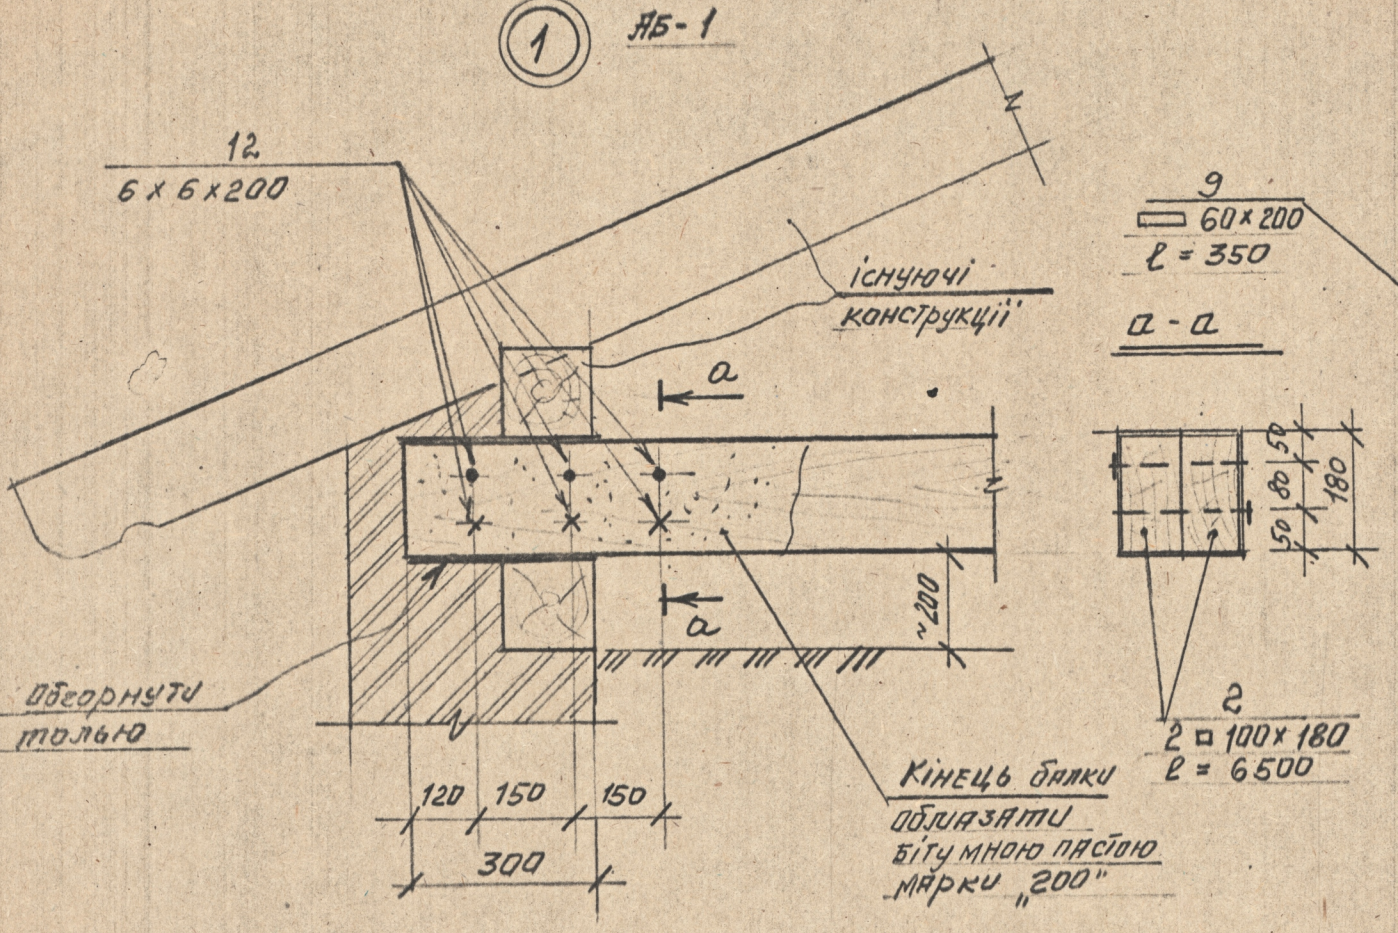

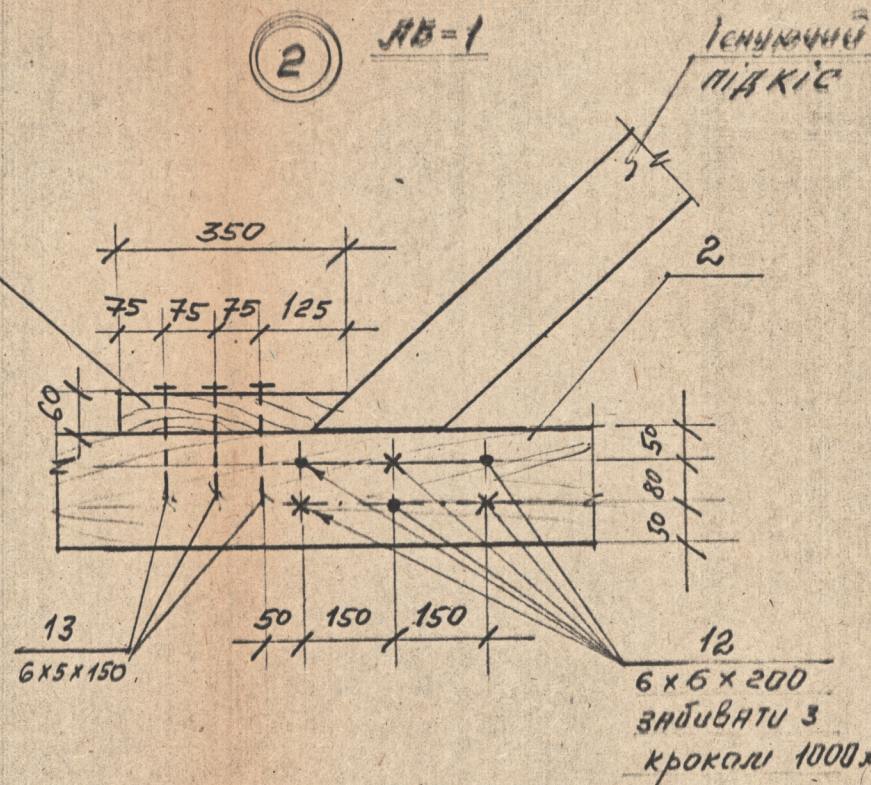

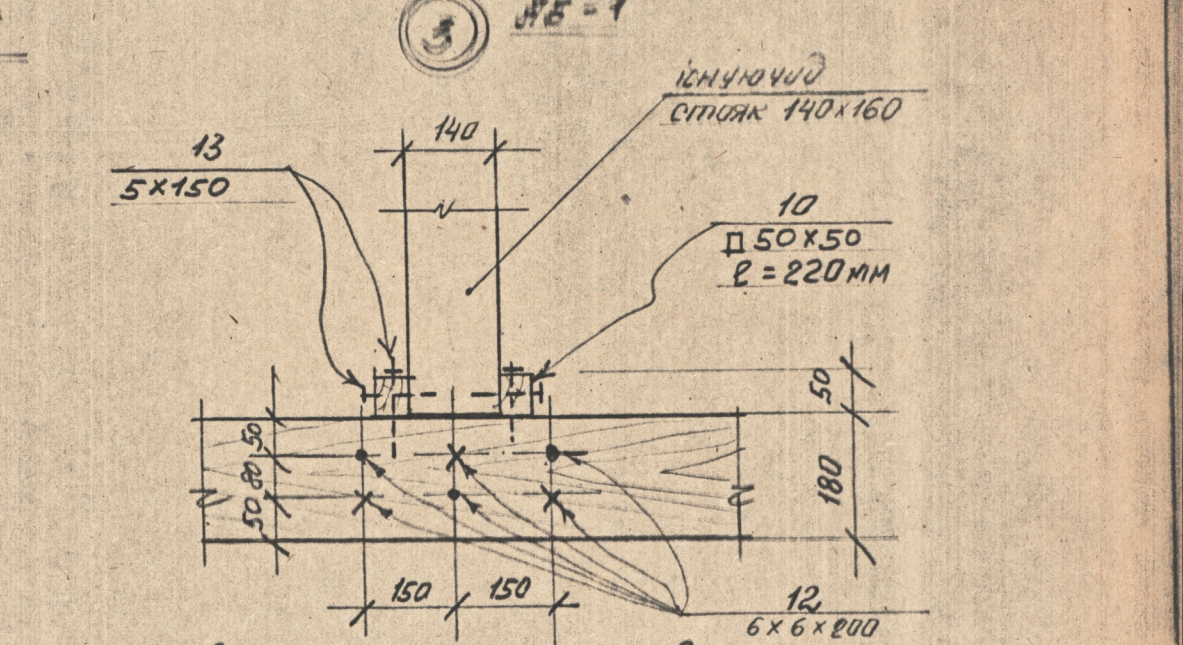

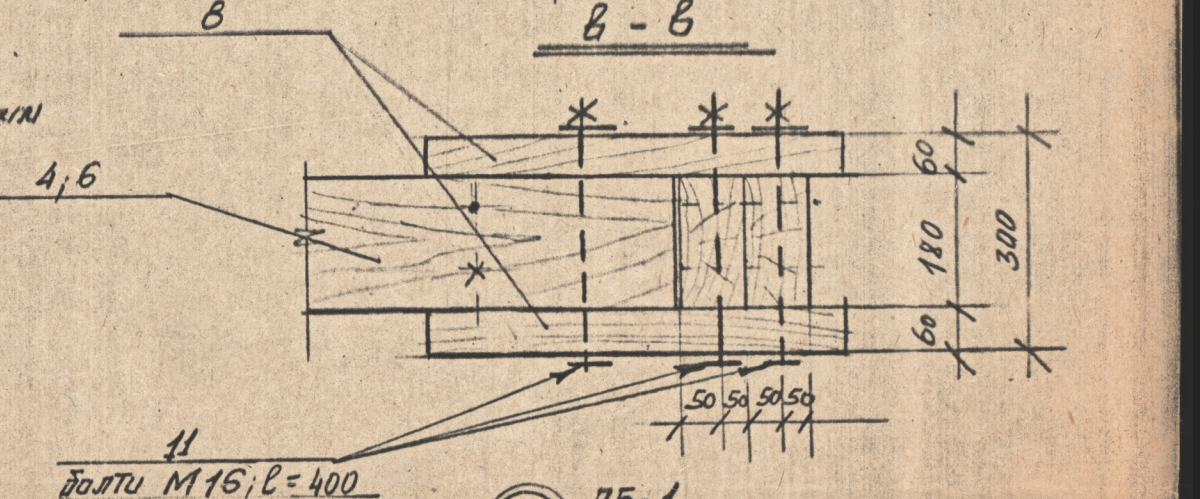

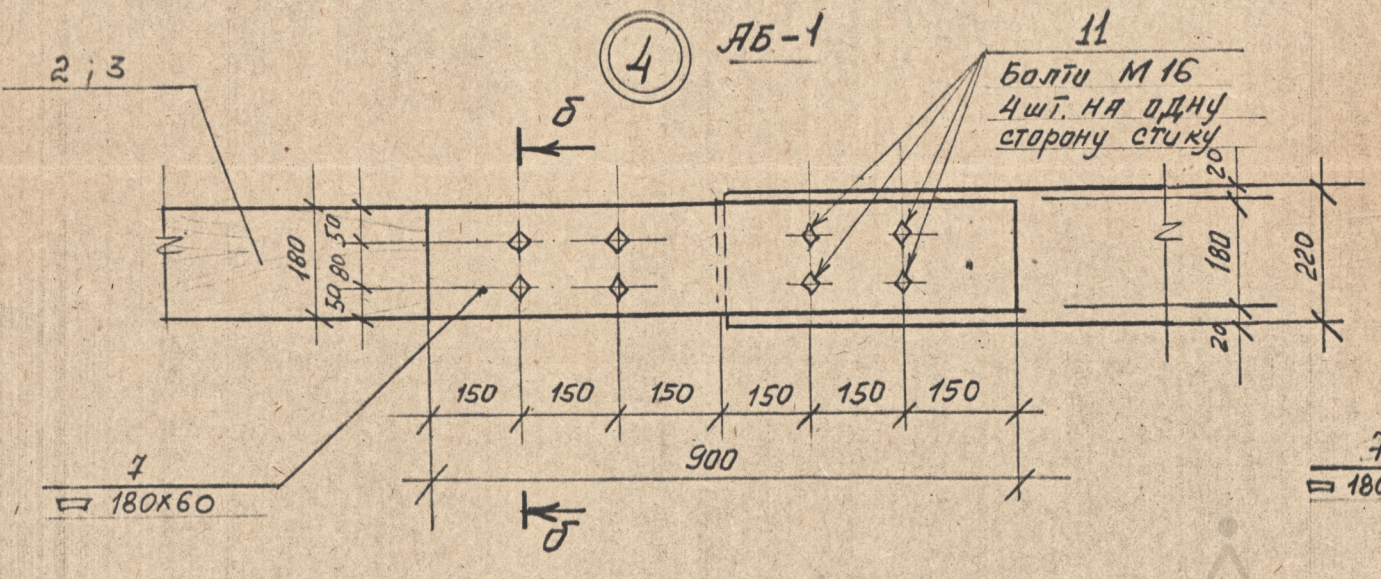

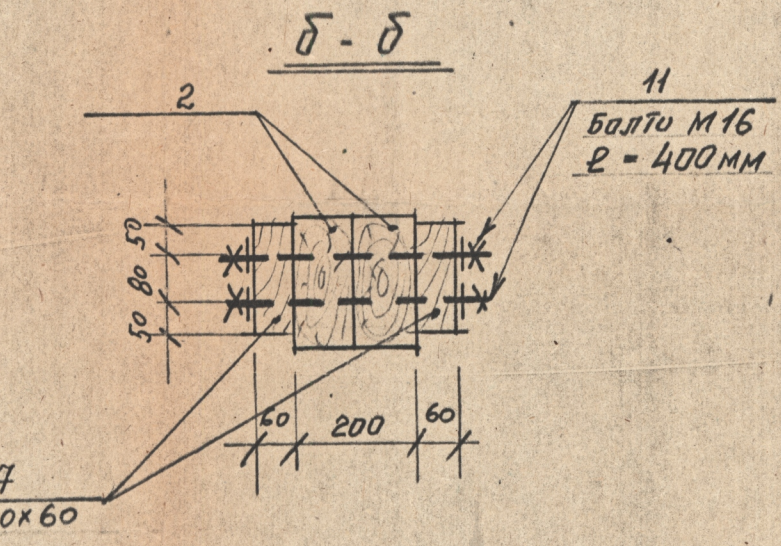

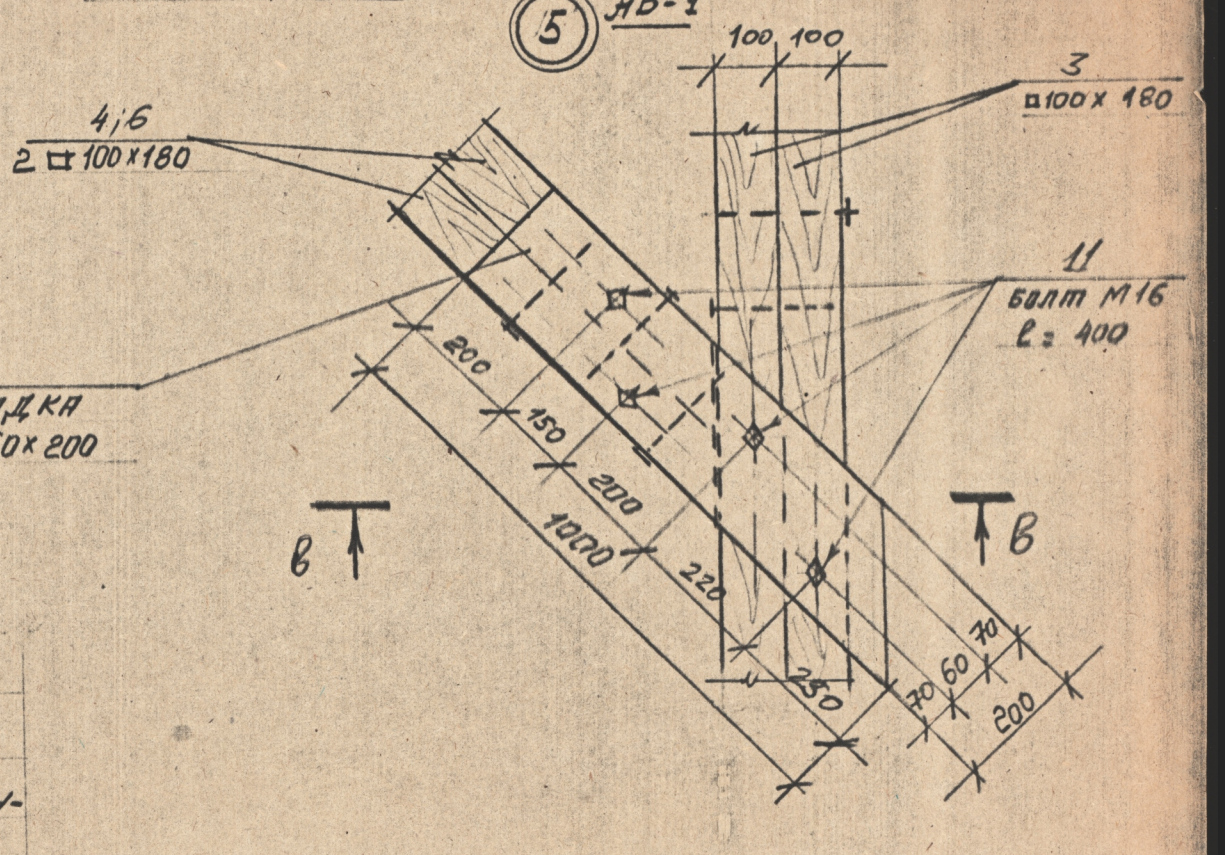

Черговість виконання робіт

1. Підперти верхній пояс рами даху в місцях опирання стояків на нижній пояс.
2. Відпиляти дефектну ділянку нижнього поясу і видалити її.
3. Підготувати нижній пояс до монтажу.
   а). два бруси ◻100×150 збити кущом цвяхів 6×6×200 з кроком 1,0м (отвори під цвяхи ⌀ 6мм свердлити діаметром ⌀5,5мм.
   б). просвердлити отвори ⌀16мм в брусах і накладках для стикового з'єднання.
4. Вставити новий нижній пояс в опорне гніздо, закріпити його в робочому положенні та виконати стик поясів
5. Закріпити накладками стояки та підкоси до нижнього поясу.
6. Всі розміри дані в проекті уточнити по місцю.

Кер.гр	Гевак А.		07.94
Проектув.	Мануйлик		07.94
Перевір.	Гевак А		07.94

Авторський нагляд

Пам'ятка архітектури XVIII ст. Костьол та монастир св. Лазаря у м. Львові (ох. № 353)

Монастирські приміщення

Стадія	Аркуш	Аркуш
Р	АБ-2	2

Вузли 1÷5
Черговість ведення робіт

інститут
Укрзахідпроект
реставрація

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

План нижніх поясів даху

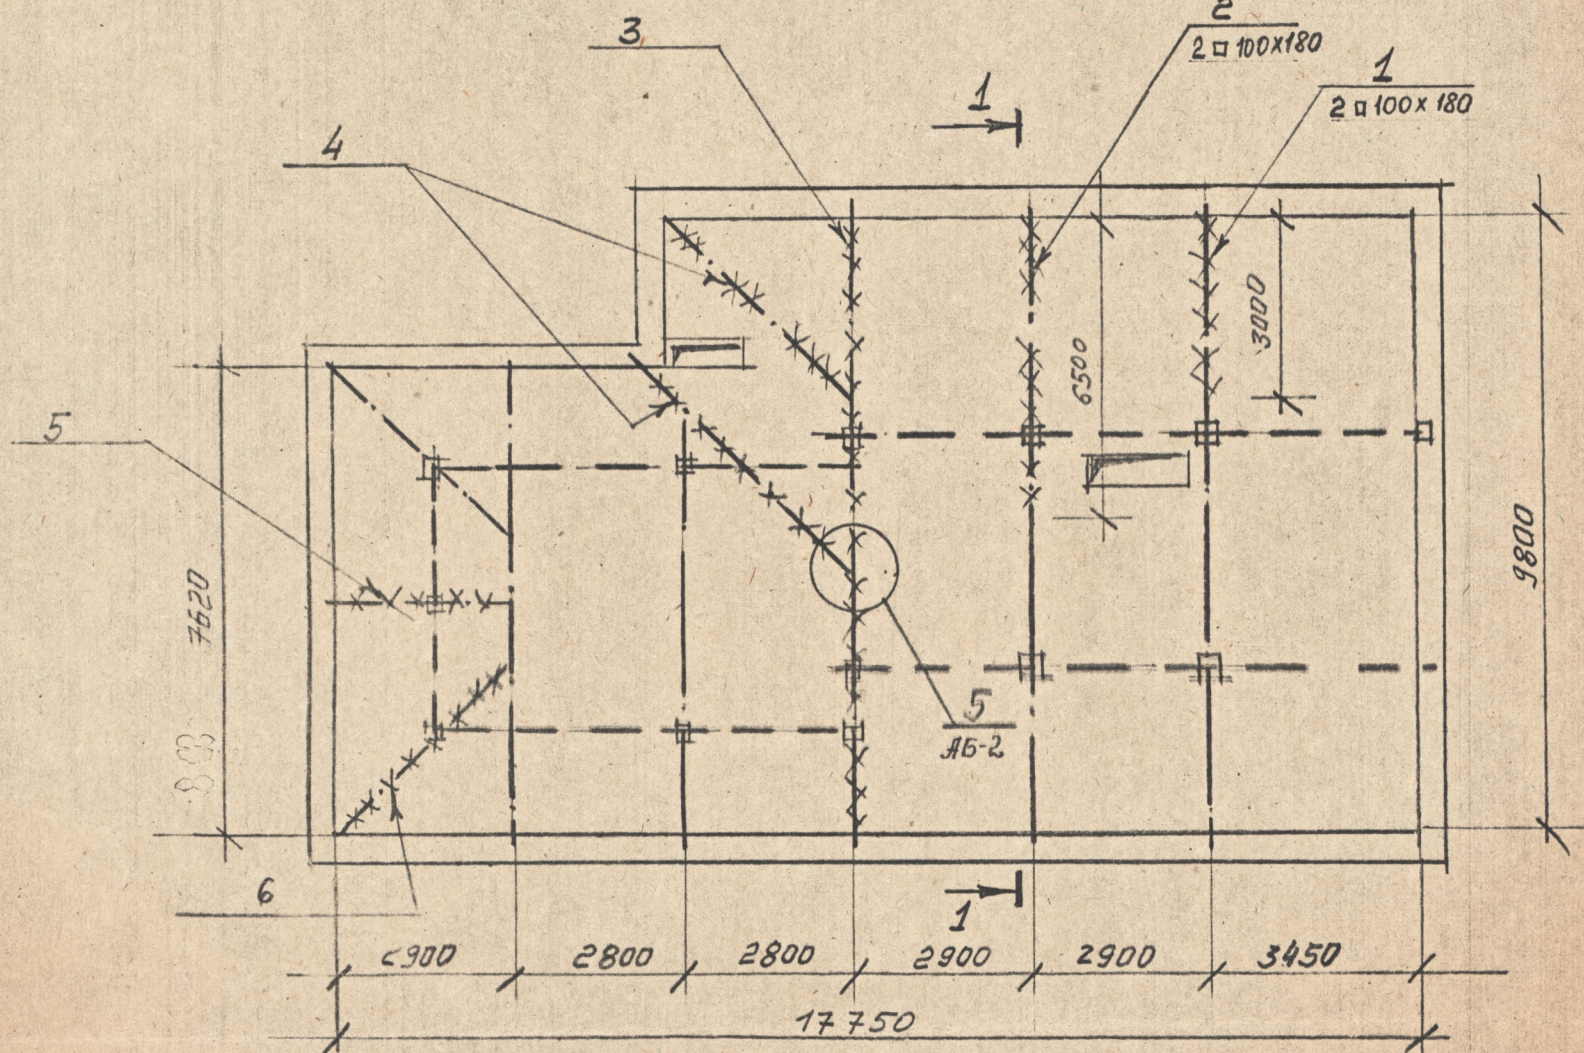

Умовні позначення

×××× · ×××× Дефектні ділянки, що підлягають заміні

Витрата матеріалів на нижні пояси

□ 100 × 180 — 1,430 $м^3$

▭ б = 60 — 0,132 $м^3$

□ 50 × 50 — 0,01 $м^3$

Специфікація виробів на 1 елемент

Позиц. познач.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса обєм од-ці	Прим. (всього)
		Дахові конструкції			
		деревяні елементи			
1	АБ-1; АБ-2	2 □ 100 × 180; ℓ = 3500	1	0,126	0,126
2	— " —	2 □ 100 × 180; ℓ = 6500	1	0,234	0,234
3	— " —	2 □ 100 × 180; ℓ = 5700	2	0,205	0,410
4	— " —	2 □ 100 × 180; ℓ = 5600	2	0,200	0,400
5	— " —	2 □ 100×180; ℓ = 2900	1	0,104	0,104.
6	— " —	2 □ 100×180; ℓ = 4200	1	0,151	0,151
7	— " —	▭ 180 × 60; ℓ = 900	6	0,01	0,06
8	— " —	▭ 200 × 60; ℓ = 1000	6	0,012	0,072
9	— " —	▭ 200 × 60; ℓ = 350	6	0,004	0,024
10	— " —	□ 50 × 50; ℓ = 220	16	0,0006	0,009
		металеві елементи			
11	АБ-1; АБ-2	болт М16, ℓ = 400	34	0,7	24,0 кг
12	— " —	цвяхи 6×200	—	—	5,0 кг
13	— " —	цвяхи 5×150	—	—	3,0 кг

1). На даних кресленнях розроблено заміну дефектних ділянок нижніх поясів рам даху.

2). Для заміни застосовані деревяні елементи з сосни I-ї категорії вологістю ≥ 23%

3). З'єднання елементів запроектовано:

а). на цвяхах (вказано лише характеристики розрахункових з'єднань).

б). на болтах; ГОСТ 5781-82;

4). Захист деревини: Всі елементи конструкцій глибоко насичити антипіренами з поглинанням сухих солей ≥ 75 кг/$м^3$ і антисептика 2,5 кг/$м^3$ (антипірен – препарат ББК-310.

5). Опорні частини додатково обмастити бітумною пастою марки 200.

6. Всі деревяні елементи ізолювати від кам'яних двома шарами толі.

1 - 1

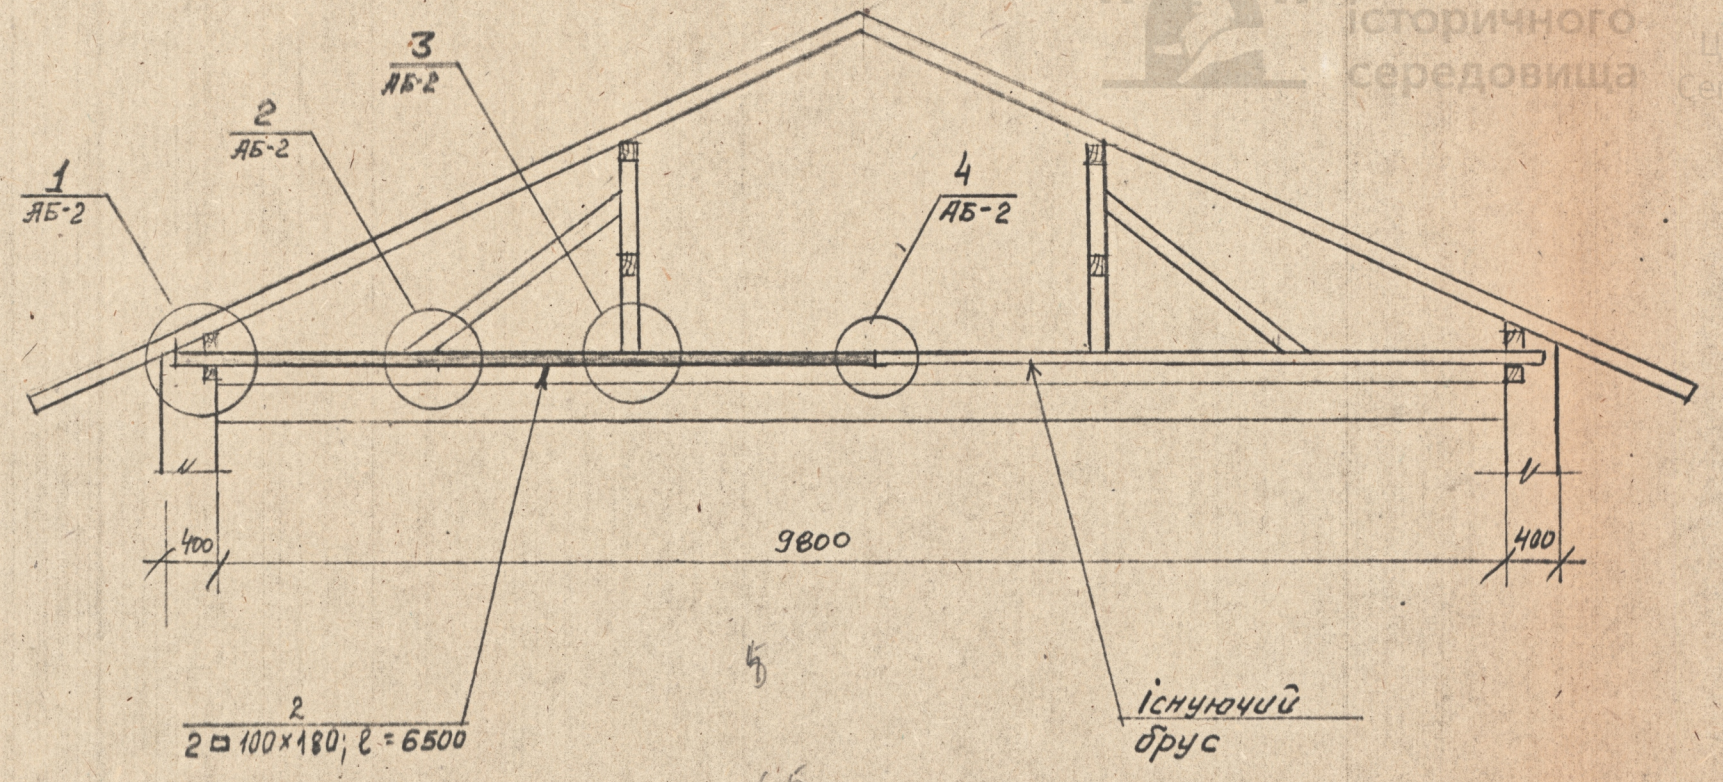

5

6,5

				Авторський нагляд			
				Пам'ятка архітектури XVIII ст. Костьол та монастир св. Лазаря у м. Львові			
Кер. гр.	Гевак Л.		0.7.94р	Монастирські приміщення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Проект.	Мануйлик Л.		07.94р		Р	АБ-1	2
Перевір	Гевак Л.		07.94р				
				План нижніх поясів даху "Специфікація виробів"	Інститут "Укрзахідпроектреставрація"		

Управління охорони історичного середовища

Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org
